



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
OBRA POR CONTRATO

EN LA CIUDAD DE NOGALES, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE NOGALES, ESTADO DE SONORA, SIENDO LAS 8:30 A.M. HORAS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2026, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON TOPAZ (ENTRE CALLES AGUA MARINA Y CALLEJON TOPAZ FINAL), COLONIA LOS TAPIROS, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA.

AL ACTO ASISTIERON LOS C. ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA, ING. OTILIA VERENICE VERDUGO CASTRO, ING. MANUEL HUMBERTO RIOS LOPEZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, LA EMPRESA CONSTRUCTORA BETONDECKE S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. RENE MARTINEZ RAMIREZ, EN CARÁCTER DE CONTRATISTA DE OBRA, EL ING. CARLOS MOSQUEIRA TALAMANTE, COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, EN CARÁCTER DE TESTIGO.

DECLARACIONES

LA OBRA DE LA PRESENTE, FUE ASIGNADA A LA EMPRESA CONSTRUCTORA BETONDECKE S.A. DE C.V., SEGÚN CONTRATO NÚMERO MNS-LP-MZ11/26 POR UN MONTO DE \$ 6,972,003.94, INCLUYE IVA., CON UN PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL DÍA 06 DE ABRIL DE 2026 AL DÍA 03 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME A LO ESTIPULADO EN CONTRATO.

ADEMAS SE LE ASIGNO UN CONVENIO POR PLAZO CON NUMERO MNS-LP-MZ11/26-A1, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL DÍA 04 DE AGOSTO DE 2026 AL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, DECLARA QUE LA OBRA FUE CONTRATADA BAJO LA MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA, DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, Y QUE LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA FUE AUTORIZADA POR FONDOS MUNICIPALES 2026.

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA, INDICA QUE EL MONTO TOTAL EJERCIDO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

RELACION DE ESTIMACIONES:

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRATO NORMAL	
ANTICPO	\$ 2,091,601.18
ESTIMACION NO. 1	\$ 958,100.54
ESTIMACION NO. 2	\$ 1,048,012.85
ESTIMACION NO. 3	\$ 1,167,865.31
ESTIMACION NO. 4	\$ 942,513.67
ESTIMACION NO. 5	\$ 763,910.38
SUMA TOTAL	\$ 6,972,003.93

OBTENIENDO UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE \$ 6,972,003.93 (SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRES PESOS CON 93/100 M.N.).



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CLV	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
CONTRATO NORMAL			
1	DEMOLICION DE PAVIMENTO Y/O RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON COMPRESOR	M²	56.66
2	ALINEACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN TERRENO	M²	1432.63
3	EXCAVACION TIPO CAJON Y/O CORTES DE CALLES PARA DAR NIVEL DE SUBRASANTE PARA COLOCACION DE PAVIMENTO EN MATERIAL TIPO"B"	M³	77.36
4	EXCAVACION TIPO CAJON Y/O CORTES DE CALLES PARA DAR NIVEL DE SUBRASANTE PARA COLOCACION DE PAVIMENTO EN MATERIAL TIPO"C"	M³	309.45
5	TRATAMIENTO DE TERRENO NATURAL A 15 CMS DE PROFUNDIDAD, INC. LA INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTACION AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR	M³	214.89
6	TERRAPLEN COMPACTADO, AL 95% DE SU PVSIM PARA DAR NIVEL DE SUBRASANTE CON MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE.	M³	0.00
7	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA EL 1er KM, INC. 30% DE ABUNDAMIENTO EN EXCAVACIONES Y 60% DE ABUNDAMIENTO EN DEMOLICIONES (EN CASO DE HABER)	M³	516.52
8	ACARREO DE MATERIAL KMS. SUBSECUENTES, HASTA UN RADIO DE 15 KMS	M³	10514.75
9	JUNTA DE CONSTRUCCION LONGITUDINAL, SE CONSTRUIRA AL CENTRO DE LA SECCION CON BARRAS DE AMARRE DE 3/8" DE DIAMETRO Y 60CM DE LONGITUD, ESPACIADAS A 1,00 MTS EN LA RECTA Y 0,70 MTS EN CURVAS, INC. POLIDUCTO DE 3/4" PARA ENFUNDAR PASAJUNTAS Y GRASA AUTOMOTRIZ, COLOCACION DE CORDON DE RESPALDO Y SELLADO CON SIKA FLEX O SIMILAR	M	114.90
10	JUNTA DE CONTRACCION LONGITUDINAL CONSISTE EN CORTE CON DISCO CON UNA PROFUNDIDAD DE 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA; SE CONSTRUIRA A 1/4 DE LA SECCION A PARTIR DE LA GUARNICION EN AMBOS LADOS, INC. CORTE CON DISCO DOBLE PARA LA COLOCACION DE CORDON DE RESPALDO Y SELLADO CON SIKA FLEX O SIMILAR	M	225.20
11	JUNTA DE EXPANSION TRANSVERSAL SERA @ 24,00 MTS Y EN BOCACALLES INTEGRADAS CON PASA JUNTAS DE REDONDO LIJO DE 3/4" POR 60 CMS DE LONGITUD ESPACIADAS @ 50 CMS. INC. CELOTEX ASFALTICO DE 1/2" POLIDUCTO DE 3/4" PARA ENFUNDAR PASAJUNTAS Y GRASA AUTOMOTRIZ, COLOCACION DE CORDON DE RESPALDO Y SELLADO CON SIKA FLEX O SIMILAR	M	50.45
12	JUNTA DE CONTRACCION TRANSVERSAL A BASE DE JUNTA PLASTICA SIP STRP @ 4,00 MTS	M	353.15
13	CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO "L" DE 130 LTS/ML DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACION, COMPACTACION DE AREA DE DESPLANTE, CIMBRA, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, PULIDO, CURADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M	582.40
14	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM², TMA 1 1/2", DE 15 CMS DE ESPESOR, INC. COLADO, VIBRADO, ACABADO ESCOBILLADO, VOLTEO DE ARISTAS Y CURADO CON CURACRETO Y FIBRA	M²	1432.63
15	CONSTRUCCION DE DENTELLON DE 20X30 CMS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM², TMA 1 1/2", INC. FIBRA, COLADO, VIBRADO Y CURADO	M	7.82
16	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE PIEDRA BOLA DE LA REGION Y ACENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INC. LLORADEROS A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4", TAMBIEN INC. EXCAVACION A MANO Y RELLENO COMPACTADO	M3	26.37
17	CIMENTACION A BASE DE PIEDRA BOLA DE LA REGION Y ACENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INC. EXCAVACION A MANO Y RELLENO COMPACTADO	M3	0.00
18	CADENA DE DESPLANTE DE 20X20 CMS A BASE DE CONCRETO F'C=200KG/CM², TMA 3/4, REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4"@ 20 CMS, INC. CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DECIMBRADO	M	0.00
19	MURO DE BLOCK DE 20X20X40 CMS ACENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 INC. CELDAS AHOGADAS Y REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8" @ 60 CMS	M2	0.00
20	CADENA DE CERRAMIENTO DE 20X20 CMS A BASE DE CONCRETO F'C=200KG/CM², TMA 3/4, REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4"@ 20 CMS, INC. CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y DECIMBRADO	M	0.00
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA (SR-8) "ALTO", DE 71X71 CMS. GALVANIZADO, INC. EXCAVACION A MANO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE A BASE DE PTR 2"X2" GALVANIZADO Y 2,50 MTS DE ALTURA A PARTIR DE NIVEL DE BANQUETA HASTA PARTE BAJA DE ANUNCIO Y DADO DE CONCRETO DE 15X15X30 CMS, CON NOMENCLATURA DE CALLE EN AMBOS LADOS DE LA LAMINA DE 20X91 CMS. CRUZADAS EN LA PARTE SUPERIOR DEL POSTE (SOBRE SEÑALAMIENTO DE ALTO), INC. HERRAJES Y TORNILLERIA	PZA	3.00
22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA (SR-9) DE VELOCIDAD DE 71X71 CMS, GALVANIZADO, INC. EXCAVACION A MANO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE A BASE DE PTR 2"X2" GALVANIZADO Y 2,50 MTS DE ALTURA PARTIR DE NIVEL DE BANQUETA HASTA PARTE BAJA DE ANUNCIO Y DADO DE CONCRETO DE 15X15X30 CMS	PZA	4.00
23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA TRAFICO REFLEJANTE DE 10 CMS DE ESPESOR PARA FORMAR LA RAYA SEPARADORA DE CARRILES	M	280.39
24	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M²	1782.07
25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO A BASE DE LONA VINILICA CON OJILLOS CON DIMENSIONES DE 1.20X2.40 MTS COLOCADA EN MARCO DE PTR DE 1 1/2" Y ANCLADA EN CONCRETO	PZA	1.00
26	TRAZO Y NIVELACION HORIZONTAL PARA EXCAVACION DE ZANJA	M	269.29
27	EXCAVACION EN TERRENO TIPO"B" CON RETROEXCAVADORA	M3	63.98
28	EXCAVACION EN TERRENO TIPO "C" CON RETROEXCAVADORA CON ROTOMARTILLO	M3	255.90
29	CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR	M3	20.20
30	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO SERIE 20, CON CAMPANA Y ANILLO DE HULE	M	269.29



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES
2024 - 2027

31	ACOSTILLADO CON UN ESPESOR DE 30 CMS CON ARENA	M3	149.11
32	FABRICACION DE POZO DE VISITA HASTA DE 1.80 MTS DE PROFUNDIDAD INC. BROCAL CON TAPADERA DE FoFo DE 135 KGS Y ENJARRE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	PZA	4.00
33	EXCAVACION EN TERRENO TIPO 30% EN "B" Y 70% EN "C" PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS	M3	61.32
34	INSTALACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE A BASE DE TUBO DE PVC DE 6", SILLETA DE 8 A 6" Y CODO DE 6X45	DESC	15.00
35	CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO A NIVEL DE BANQUETA DE 40X40X60 CMS A BASE DE CONCRETO F'C=150KG/CM², TMA 3/4" CON MUROS DE 10 CMS DE ESPESOR, INC. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS DE ESPESOR, INC. EXCAVACION, TAPADERA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR REFORZADA CON MALLAELECTROSOLDADA 6X6-6/6	PZA	15.00
36	RELLENO COMPACTADO EN LINEA PRINCIPAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	150.57
37	RELLENO COMPACTADO EN DESCARGA DOMICILIARIA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	61.32
38	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA EL 1er KM	M³	220.10
39	ACARREO DE MATERIAL KMS. SUBSECUENTES, HASTA UN RADIO DE 15 KMS, INC. 30% DE ABUNDAMIENTO	M³	3301.56
40	TRAZO Y NIVELACION HORIZONTAL PARA EXCAVACION DE ZANJA	M	294.43
41	EXCAVACION EN TERRENO TIPO "B" CON RETROEXCAVADORA	M3	48.58
42	EXCAVACION ENTERRENO TIPO "C" CON RETROEXCAVADORA CON ROTOMARTILLO	M3	170.03
43	CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR	M3	22.08
44	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 4" DE DIAMETRO RD 28. CON JUNTA DE HULE INC. CONEXIONES.	M	294.43
45	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE PVC DE 4"X4"	PZA	2.00
46	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC DE 4"X11"15' INC. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00
47	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC DE 4"X22"30' INC. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	4.00
48	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR DE PVC DE 4"	PZA	7.00
49	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAMPANA DE PVC DE 4"	PZA	1.00
50	CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO POBRE F'C=150 KG/CM² CON MEDIDAS DE 30X30X50 CMS	PZA	8.00
51	ACOSTILLADO CON UN ESPESOR DE 50 CMS, CON MATERIAL DE BANCO. EL TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO SERA DE 1.5"	M3	108.02
52	RELLENO COMPACTADO EN LINEA PRINCIPAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	112.80
53	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE VALVULAS, EXTREMIDAD CAMPANA Y ESPIGA. INC. VALVULA DE COMPUERTA 4" DE DIAMETRO BRIDADA, EXCAVACION, COLOCACION DE CAJA, RELLENO COMPACTADO, MARCO, CONTRAMARCO Y TAPADERA	PZA	1.00
54	INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA EQUITEK DE 1/2", INC. EXCAVACION, ABRAZADERA DE INSERCCION DE 4 a 1/2", VALVULA DE INSERCCION, CONECTOR MACHO, 6.00 MTS DE TUBERIA EQUITEK DE 1/2", CONECTOR HEMBRA, NIPLES, VALVULA ANTIFRAUDE VEAGN DE 1/2", CAJA DE REGISTRO DE PLASTICO DE 0.30X0.43X0.30 M. CON TAPA DE 0.30X0.43M CON REFUERZO DE 2 VARILLAS DE 3/8" CON LONGITUD DE 50 CMS POR PIEZA, CAMA DE ARENA, RELLENO COMPACTADO.	TOMA	15.00
55	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA EL 1er KM	M³	208.17
56	ACARREO DE MATERIAL KMS. SUBSECUENTES, HASTA UN RADIO DE 15 KMS, INC. 30% DE ABUNDAMIENTO	M³	3122.55
57	CORTE CON DISCO A 1/3 DE PROFUNDIDAD DE LA LOSA, INC. TRAZO DE LA SUPERFICIE A CORTAR	M	173.99
58	DEMOLICION DE PAVIMENTO Y/O RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON COMPRESOR	M2	122.90
59	TRAZO Y NIVELACION HORIZONTAL PARA EXCAVACION DE ZANJA	M	84.97
60	EXCAVACION EN TERRENO TIPO "B" CON RETROEXCAVADORA	M3	24.67
61	EXCAVACION ENTERRENO TIPO "C" CON RETROEXCAVADORA CON ROTOMARTILLO	M3	222.00
62	CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR	M3	12.75
63	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ADS N-12 DE 15", CON CAMPANA	M	84.97
64	ACOSTILLADO CON UN ESPESOR DE 30 CMS CON ARENA	M3	63.73
65	CONSTRUCCION DE REJILLA DE 1.40 X4.00X1.15 MTS DE PROFUNDIDAD A BASE LOSA DE CIMENTACION DE 20 CMS DE ESPESOR CONCRETO F'C=200KG/CM², TMA 3/4", REFORZADO CON MALLAELECTROSOLDADA 6X6-10/10, MUROS DE BLOCK DE 20X20X40CMS, CASTILLOS AHOGADOS REFORZADO CON UNA VARILLA DE 3/8" @ 2 CELDAS Y CASTILLOS DE 20X20 CMS @ 3.00 MTS CON 4 VS. DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS. CADENA DE CERRAMIENTO DE 20X30 CMS REFORZADA CON 4 VS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS. CONCRETO F'C=200KG/CM² Y REJILLAS A BASE DE MARCO DE ANGULO DE 4"X1/2", CONTRAMARCO DE ANGULO DE 3"X1/2", SOLERA DE 3"X1/2" @ 5 CMS, SE INC. UN REFUERZO LONGITUDINAL AL CENTRO DE LA PARILLA CON SOLERA DE 3" X 1/2". (LAS PARILLAS SE ARAN EN MODULOS DE 1.00 MTS DE LONGITUD PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO DE LA MISMA	PZA	1.00
66	CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 1.40X1.40 X2.84 MTS DE PROFUNDIDAD PARA MANTENIMIENTO A TUBERIAS A BASE MUROS DE BLOCK DE 20X20X40 CMS REFORZADO CON CASTILLOS AHOGADOS CON VARILLA DE 5/8" @ 40 CMS, INC. LOSA DE CIMENTACION DE 20 CMS DE ESPESOR REJILLAS A BASE DE MARCO DE ANGULO DE 4"X1/2", CONTRAMARCO DE ANGULO DE 3"X1/2", SOLERA DE 3"X1/2" @ 5 CMS, SE INC. UN REFUERZO LONGITUDINAL AL CENTRO DE LA PARILLA CON SOLERA DE 3" X 1/2"	PZA	1.00
67	CONSTRUCCION DE REJILLA DE 1.40 X12.5 CON UNA PROFUNDIDAD DE 0.91 MTS A TERMINAR A CERO, A BASE LOSA DE CIMENTACION DE 20 CMS DE ESPESOR CONCRETO F'C=200KG/CM², TMA 3/4", REFORZADO CON MALLAELECTROSOLDADA 6X6-10/10, MUROS DE BLOCK DE 20X20X40CMS, CASTILLOS AHOGADOS REFORZADO CON UNA VARILLA DE 3/8" @ 2 CELDAS Y CASTILLOS DE 20X20 CMS @ 3.00 MTS CON 4 VS. DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS. CADENA DE CERRAMIENTO DE 20X30 CMS REFORZADA CON 4 VS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS. CONCRETO F'C=200KG/CM² Y REJILLAS A BASE DE MARCO DE ANGULO DE 4"X1/2", CONTRAMARCO DE ANGULO DE 3"X1/2", SOLERA DE 3"X1/2" @ 5 CMS, SE INC. UN REFUERZO LONGITUDINAL AL CENTRO DE LA PARILLA CON SOLERA DE 3" X 1/2". (LAS PARILLAS SE ARAN EN MODULOS DE 1.00 MTS DE LONGITUD PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO DE LA MISMA	PZA	1.00



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027




68	RELLENO COMPACTADO EN LINEA PRINCIPAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	170.20
69	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA EL 1er KM	M³	99.41
70	ACARREO DE MATERIAL KMS. SUBSECUENTES, HASTA UN RADIO DE 15 KMS, INC. 30% DE ABUNDAMIENTO	M³	1491.22
71	REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM², TMA 1 1/2", DE 15 CMS DE ESPESOR, INC. COLADO,VIBRADO,ACABADO ESCOBILLADO, VOLTEO DE ARISTAS Y CURADO CON CURACRETO Y FIBRA	M²	102.87

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE LA OBRA No. **MNS-LP-MZ11/26** Y CONVENIO NO. **MNS-LP-MZ11/26-A1** PRESUPUESTOS Y NÚMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA.

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UN PLAZO DE EJECUCIÓN REAL DE **83 DÍAS NATURALES**, INICIANDO EL DÍA **20 DE MAYO DE 2026** Y CONCLUYENDO EL DÍA **10 DE AGOSTO DE 2026**.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA MISMA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE QUE SEA RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE PARA SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 79 FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA OBRA, O BIEN EL TIEMPO QUE RESULTE NECESARIO HASTA LA REPARACION O ENMIENDA DE LOS TRABAJOS A PLENA SATISFACCION DE LA CONVOCANTE SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. MEDIANTE LA FIANZA No. **3128620**.

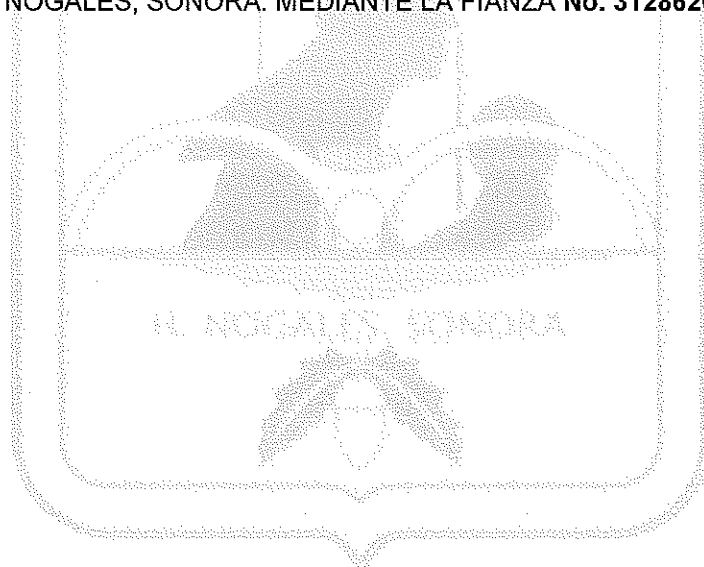



H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



ENTREGA:
EL CONTRATISTA DE OBRA

CONSTRUCTORA BETONDECKE S.A. DE C.V.
C. RENE MARTINEZ RAMIREZ

RECIBE:
EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES
REPRESENTADO POR:

EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA

ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA.

EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PÚBLICAS

ING. OTILIA VEREMICE VERDUGO CASTRO.

EL SUPERVISOR DE LA OBRA

ING. MANUEL HUMBERTO RIOS LOPEZ.

TESTIGO
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA

ING. CARLOS MOSQUEIRA TALAMANTE
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DEL
ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN
GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE NOGALES, SON.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS **09:00 AM HRS** DEL DIA **10 DE AGOSTO DE 2026**, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.
